환경관리계획서

[2026년~2027년 양지사 열수송관 천공 및 부단수 공사]

(주)대 호 스 토 퍼

■ 환경관리계획

1. 환경 관리

1) 목적 : 공사 수행시 발생되는 환경오염 물질로부터 주변환경을 보호하여 쾌적한 작업환경 및 생활환경을 보전하는데 있다.

2) 책임과 권한 : 환경관리책임자는 현장내 대기오염 방지시설의 설치 및 운영이 환경보전법 및 자체기준에 적합하도록 총괄 지휘감독할 책임이 있다.

3) 일반사항 : 환경관리책임자는 현장내 환경오염 물질 종류, 방지시설 종류, 법적 운영기준, 자체관리 기준 등을 포함하여 환경오염을 방지하기 위한 계획을 세우고 실행하여야 한다.

4) 환경오염 저감계획 :

항목	발 생 원 인	저 감 대 책
용접	용접봉 자투리발생	○작업장내 회수통 배치 ○작업완료후 수거
천공 및 차단	장비 누유 발생	○작업현장내 유흡착포 배치 ○기름 받이용 컵 준비
크레인 작업	이동중 먼지발생	○현장내 저속운행 ○상,하차 전후에 적재함 청소
칩제거	천공 칩 발생	○천공후 컷터 청소 철저 ○배관내 칩제거후 칩제거 머신 청소 철저
일반	일반 쓰레기 발생	○발생된 쓰레기는 철저히 수거하여 분리

2. 수질 관리

1)목적 : 수질오염 물질로 인한 수질오염을 사전에 방지하고 오염상태를 감시, 측정하여 생태계 파괴 등의 환경피해를 최소화 하는데 있다.

2)책임과 권한 : 환경관리책임자 및 현장대리인은 현장내 수질오염 방지관리가 수질 환경보전법 및 자체 기준에 따라 적법하게 유지관리 운영되고 있는지 총괄 지휘감독할 책임이 있다

3)일반사항 : 환경관리책임자 및 현장대리인 현장내 용수 사용량, 수질오염 작업 또는 배출시설 종류, 방지시설 종류, 폐수 및 오수 발생량, 자체관리 기준 등을 포함하여 수질관리 계획을 세우고 실행하여야한다.

3. 폐기물 관리

1)목적 : 공사 수행 중 발생되는 폐기물에 대하여 법규 준수, 환경사고 예방 및 환경오염을 방지하는데 있다.

2)책임과 권한 : 환경관리책임자 및 현장대리인 공사수행 중 발생된 폐기물에 대하여 지정된 장소에 식별 및 분리하여야 한다.

3)업무절차

가)법규준수 : 사업장은 폐기물관리법 등 폐기물 관리에 필요한 운영사항 및 관리기준 보관기준:90일 초과금지, 예외-3t미만)을 준수하여야 하며, 관리책임자는 공사현장에서 발생되는 폐기물의 종류, 성상, 배출량(1일 평균 100㎏ 이상) 등에 대한 신고필증을 득하여야 한다.

나)폐기물 발생 : 수행 부서장은 폐기물 발생에 대하여 파악하고 관리한다.

○수행 부서장는 폐기물에 대하여 폐기물 분리수거 요령에 따라 분리수거를 한다.

○수행 부서장는 폐기물 배출로 인한 환경적 영향을 감소 시키기 위한 원·부자재의 삭제, 변경, 재사용, 재활용 방안을 수립하고 실행 할수 있다.

다)처리절차

○주관 부서장는 배출된 폐기물을 위탁처리한다.

○주관 부서장은 폐기물을 위탁처리시, 위탁처리 방법에 따라 적법하게 처리

하여야 한다.

○관리책임자는 공사활동에 사용된 유독물이 극소량이라도 임의 폐기하여서는 안되며, 전량 회수하여 시공부서에서 폐기토록 한다.

○수행 부서장은 사무실 또는 작업현장에서 분리한 폐기물은 적정하게 수거하여 폐기물 보관장까지 운반하여야 한다.

라)보관 및 운반

○사업장의 일반·지정폐기물은 지정 보관장소에 보관한다.

○액체 또는 유독성의 지정폐기물을 보관시에는 전용용기를 사용하고 혼합 또는 유동에 따라 발생되는 위험이 없도록 한다.

○폐기물은 먼저 발생한 것을 처리하여 장기 보관으로 인한 2차 오염이 발생하지 않도록 한다.

○폐기물 보관시 대기중으로 흩날리거나 땅속으로 스며들지 않도록 한다.

○보관중인 폐기물은 우천등으로 인해 침출수가 발생되어 토양오염 및 수질 오염이 발생되지 않도록 조치를 취한다.

○수행 부서장은 분리 수거된 폐기물은 폐기물 보관장소로 이송하고 눈·비로부터 보호 및 바람에 흩날리지 않도록 하여야 한다.

마)처리업체 선정

○폐기물 처리는 관계법령에 의해 처리 허가를 받은 업체 에게 위탁한다.

○매각인 경우에는 “폐기물재활용 신고필증”을 받은 업체를 선정한다.

○위탁인 경우에는 “폐기물 중간처리업, 수집 운반업, 최종처리업 허가”를 받은 업체중 선정한다.

바)점검 및 측정

○관리책임자는 폐기물관리가 법규, 규정에 따라 실행되는지 수시로 확인하여야 하며, 부적합 발생시에는 부적합 관리 절차서에 따라 조치한다.

사) 건설폐기물 보관,처리

○배출현장에서 가연성(폐목재,폐합성수지 등),비가연성(폐금속류,폐콘크리트 등) 분리하여 종류별,성상별로 배출한다.

○가연성 폐기물은 소각전문 폐기물 중간처리업자 또는 폐기물 종합처리업자 위탁처리

종 류	기 준	세 분 류	신 고 대 상	보 관
가연성	폐목재, 폐합성수지	종류별, 성상별로 배출	-건설공사 등에 의해 폐기물을 5톤이상 배출 하는자 -공사의 경우 발주자로부터 최초의 공사를 전부를 도급받은자 포함	-보관개시일로부터 90일 이내 처리 -보관폐기물의 양이 8톤미만 (도로보수공사 과정의 폐콘크리리트 및 폐아스콘이 발생하는 경우 50톤 미만)의 경우 제외 -건설폐기물은 건설공사 완료 후 건설현장에 보관해서는 안 됨 -시.도경계를 이동하여 보관할 수 없음
비가연성	폐금속류, 폐콘크리트 등			

※ 산업폐기물 처리절차.

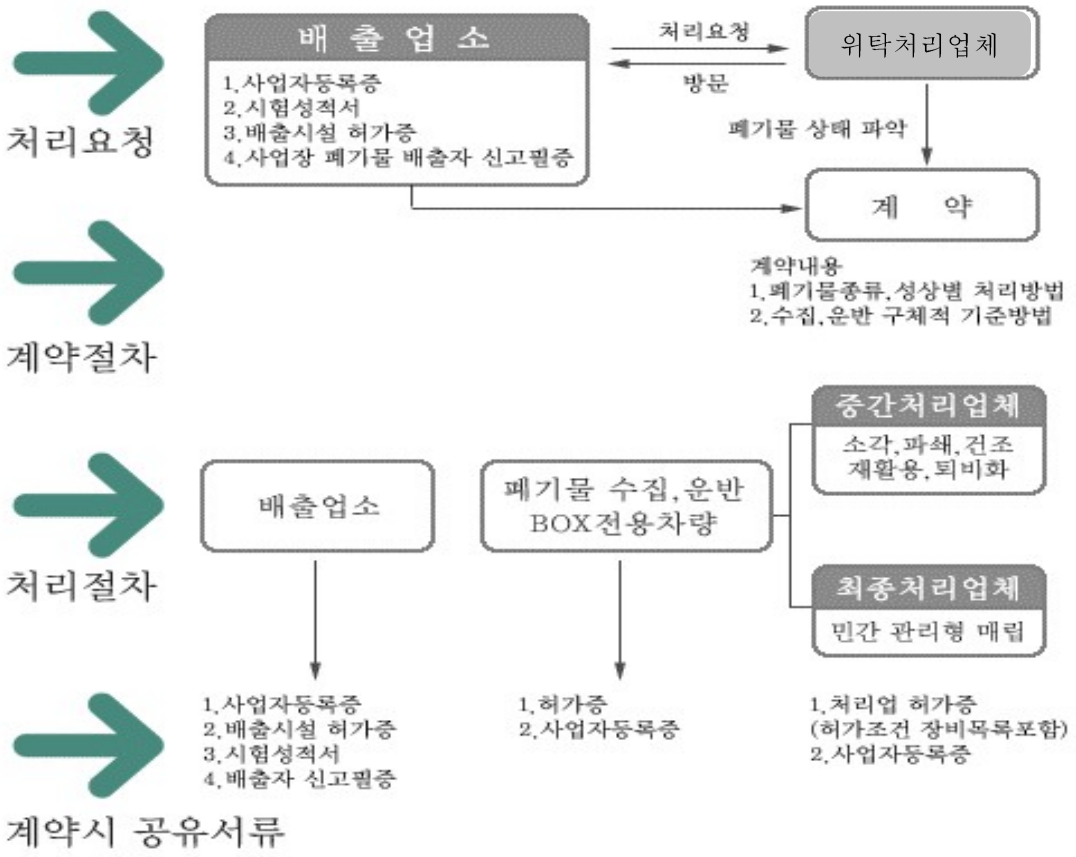

4. 소음진동 관리

1)목적 : 현장에서 발생하는 소음진동으로 인한 피해를 방지하고, 모든 이해관계자가 쾌적한 환경에서 생활 할 수 있도록 하는데 있다.

2)책임과 권한 : 환경관리책임자는 현장내 소음진동 규제법 등 관련된 법규 및 자체기준을 준수하여 소음진동관리가 적합하게 되도록 총괄 지휘 감독할 책임이 있다.

3)일반사항 : 환경관리책임자는 현장내 소음진동 발생장소, 발생크기, 발생원인, 방지대책, 자제 소음진동 관리기준 등 포함하여 소음진동 저감 계획을 수립하고 실행하여야 한다.

4)공종 소음 진동 저감 대책

공 종	소 음 진 동 저 감 대 책
건설 기계 (공통)	○각 공종에서 사용하는 건설기계는 저소음의 것을 선정 ○건설기계의 가동시 불필요한 공회전 및 고속운전을 삼가 ○흡음기 또는 소음기를 장착
천공 공사	○파워유닛트 설치시에는 주변지역에 대한 소음진동의 영향이 적은 곳을 택하며, 필요에 따라 방음대책을 강구한다. ○불필요한 공회전을 삼가토록 한다.
차단 공사	○파워유닛트 설치시에는 주변지역에 대한 소음진동의 영향이 적은 곳을 택하며, 필요에 따라 방음대책을 강구한다. ○불필요한 공회전을 삼가토록 한다.
크레인 작업	○크레인 설치시에는 주변에 대한 소음진동의 영향이 적은 곳을 택하여 설치한다. ○주변지역이 소음진동에 영향이 많을 경우 시공사와 협의하여 야간작업은 가급적 진행하지 않는다.

환경보존비 사용계획서

업 체 명	㈜대호스토퍼	발 주 자	서울에너지공사	
공 사 명	2026년~2027년 양지사 열수송관 천공 및 부단수 공사			
소 재 지	서울시 일원	대 표 자	이 영 호	
공 사 금 액	금 1,433,893,000원	공 사 기 간	착 공 일	2026 년 03 월 13 일
			준 공 일	2027 년 12 월 31 일
계 상 된 환경보존비	금 2,000,000원	공사 진척에 따른 사용 기준 금액		금 3,105,993원

사 용 계 획

품 명	규 격	수 량	단 가	금 액	비 고
1) 노 무 비				-	
2) 재 료 비				600,000	
3) 기 타				1,000,000	고무판
계				1,600,000	

건설공사 표준 환경보존비 계상 및 사용기준에 의거 위와 같이 사용 계획서를 제출합니다.

2026년 03월 13일

주 소 : 경기 안산시 단원구 남산평길 126-4(팔곡일동)

상 호 : ㈜대호스토퍼

성 명 : 대표이사 이 영 호 (인)

서울에너지공사 귀하 귀하

세 부 사 용 계 획

항 목	세 부 항 목	단위	수 량	단 가	금 액	비 고
1) 노 무 비		일 일 일 일			- - - -	
	소 계	일	-		-	
2) 재 료 비	부직포	개 개 개	6	100,000	600,000 -	
	소 계	식			600,000	
3) 기 타	폐기물 처리	식	2	500,000	1,000,000	
	소 계	식			1,000,000	
